

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Выполнение работ по капитальному ремонту кровли на здании Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Химик»

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Преусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	П
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего		
	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	13=5-9	
6 000 000,00	5 700 000,00	240 000,00	60 000,00	5 736 074,23	5 447 238,80	228 835,43	60 000,00	5 733 935,58	2 138,65	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

**2. Сведения об итогах реализации проекта.**

1. Объект, включенный в проект, завершен \_\_\_\_\_  
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: \_\_\_\_\_
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 31.10.2022 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 21.12.2022 г.
5. К отчету прилагаются на 9 листах: фотографии объекта до начала работ, в процессе реализации и по итогам реализации проекта.

Инициатор:

Коржин М.А.

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Болотников А.В.

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

МП

Дата


2022 г.



Фотографии объекта до начала работ



Фотографии объекта в процессе реализации проекта

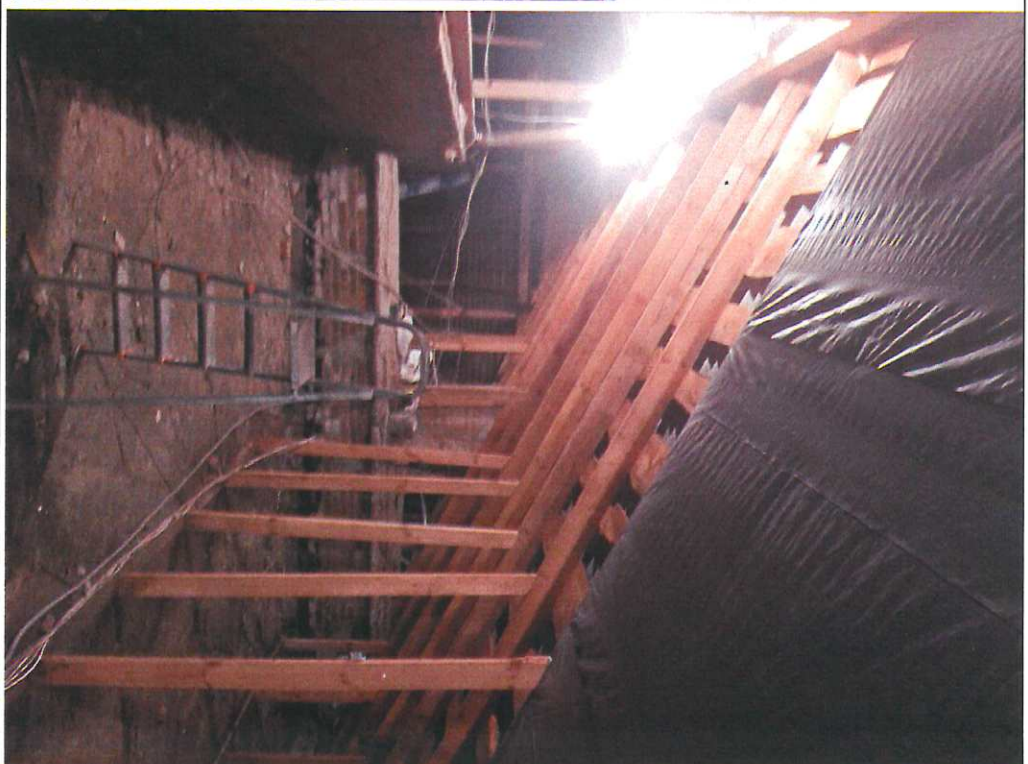



Фотографии объекта после реализации проекта





