

# ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Выполнение работ по замене части периметрального ограждения и устройство контейнерной площадки на территории Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Химик»

## 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.			
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего				
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9
1 000 000,0	950 000,0	40 000,00	10 000,00	844 959,44	802 711,47	33 798,38	8 449,59	844 959,44	802 711,47	33 798,38	8 449,59	0

\* - Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен \_\_\_\_\_ своевременно  
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:  
\_\_\_\_\_

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 06.10.2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 29.11.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 7 листах: фотографии объекта до начала реализации проекта, этапов выполнения работ и по итогам реализации проекта.

Инициатор:

Аксаков Е.В.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Болотников А.В.


(Ф.И.О.)



(подпись)

М.П.

Дата «05» сентября 2021 г.

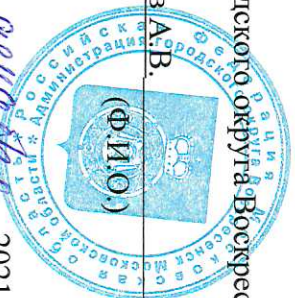





Фотографии объекта до начала реализации проекта



Приложение






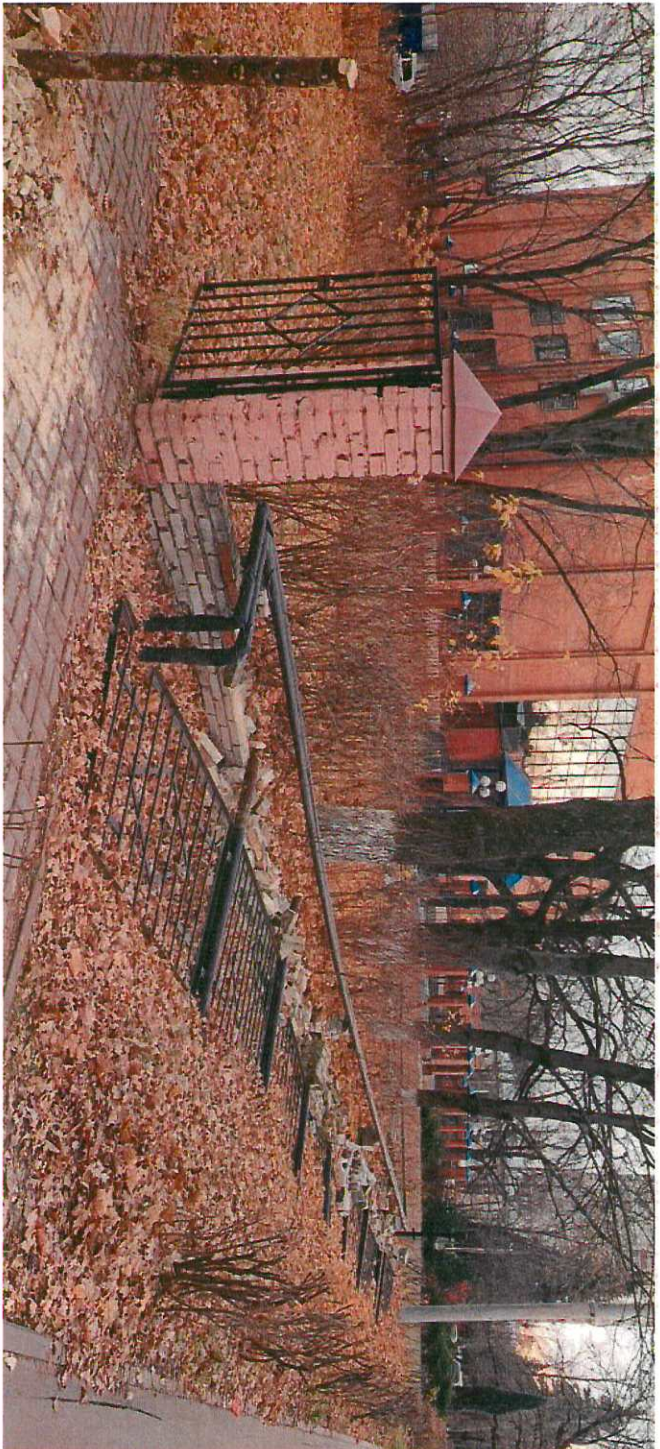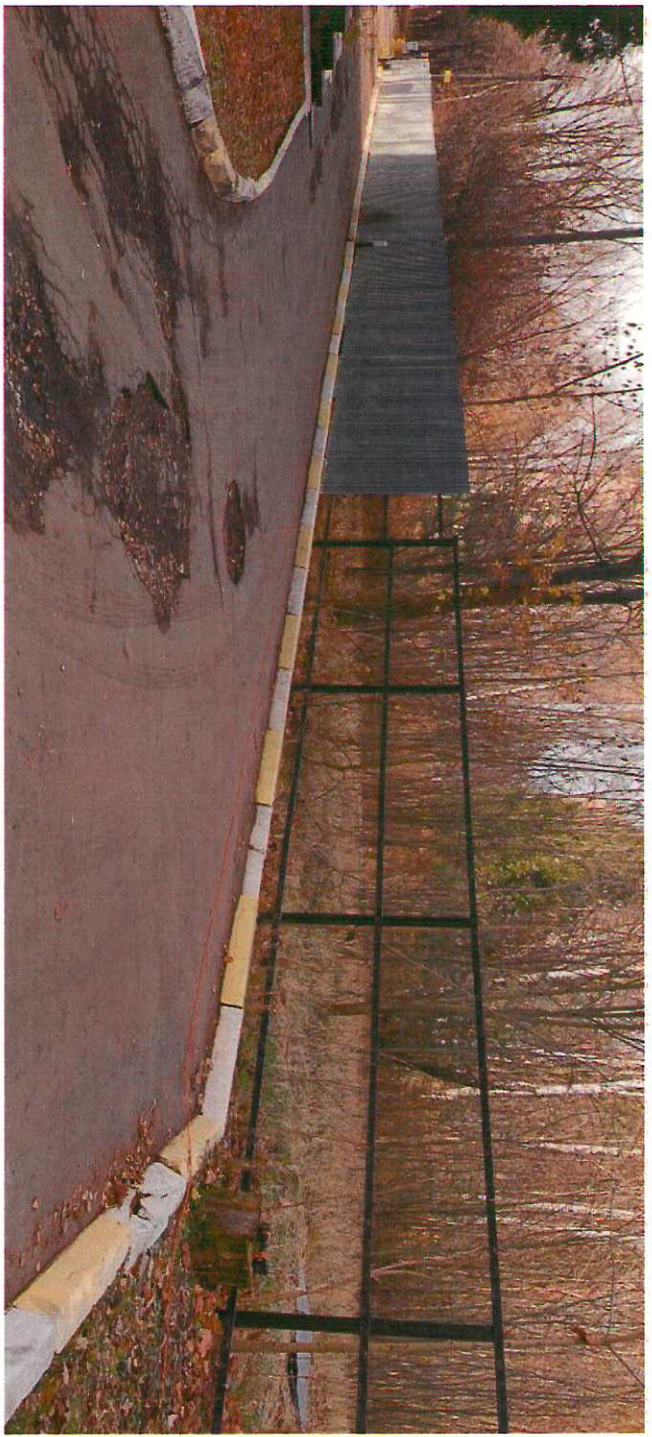







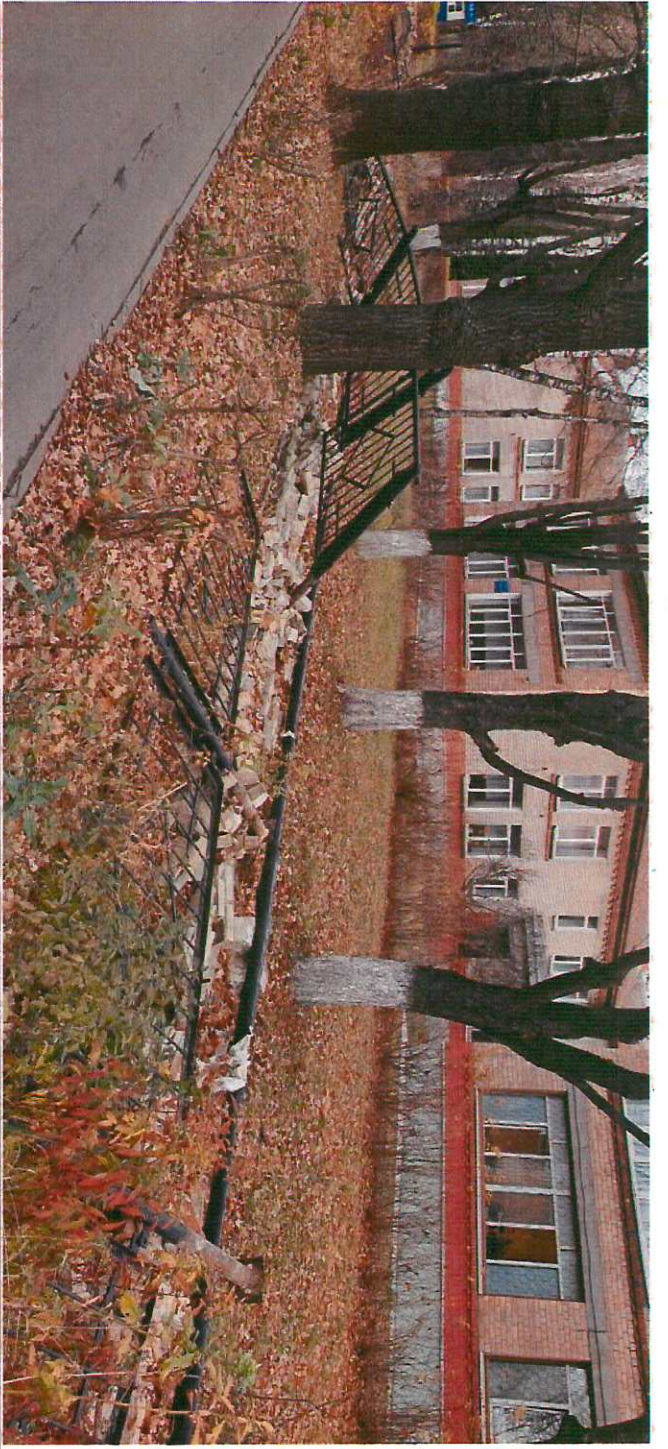



Фотографии по итогам реализации проекта









