

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Выполнение капитального ремонта асфальтового покрытия территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Химик»

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
1490000,0	1060000,0	415100,0	14900,0	1399131,34	969131,34	415100,0	14900,0	1362269,52	969131,34	379515,49	13622,69	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

### 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно  
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

\_\_\_\_\_.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 03.10.2023 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 20.10.2023 г.
5. К отчету прилагаются на 5 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Лобышева Е.А.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Глава городского округа:

Малкин А.В.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

М.П.


Дата  20\_\_ г.








V2

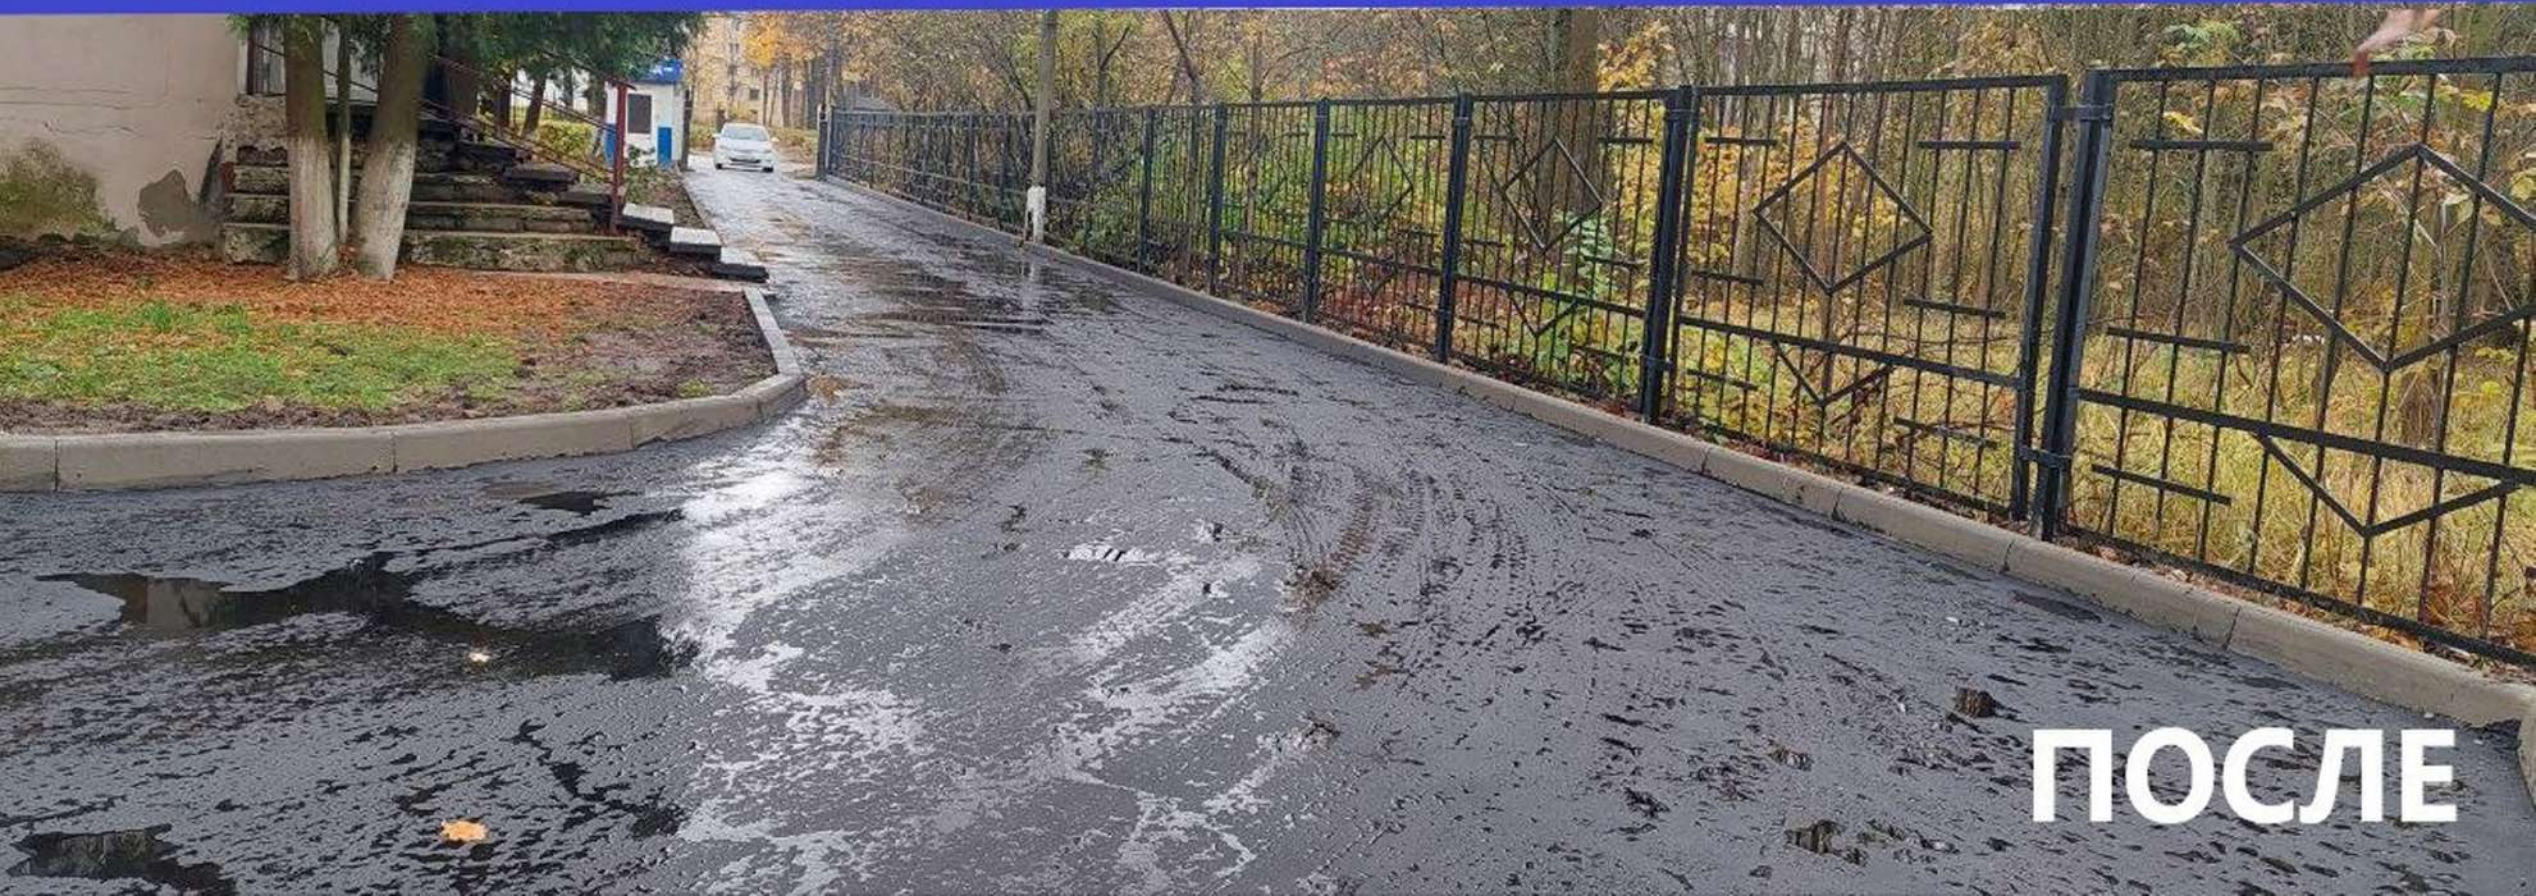



**ДО**

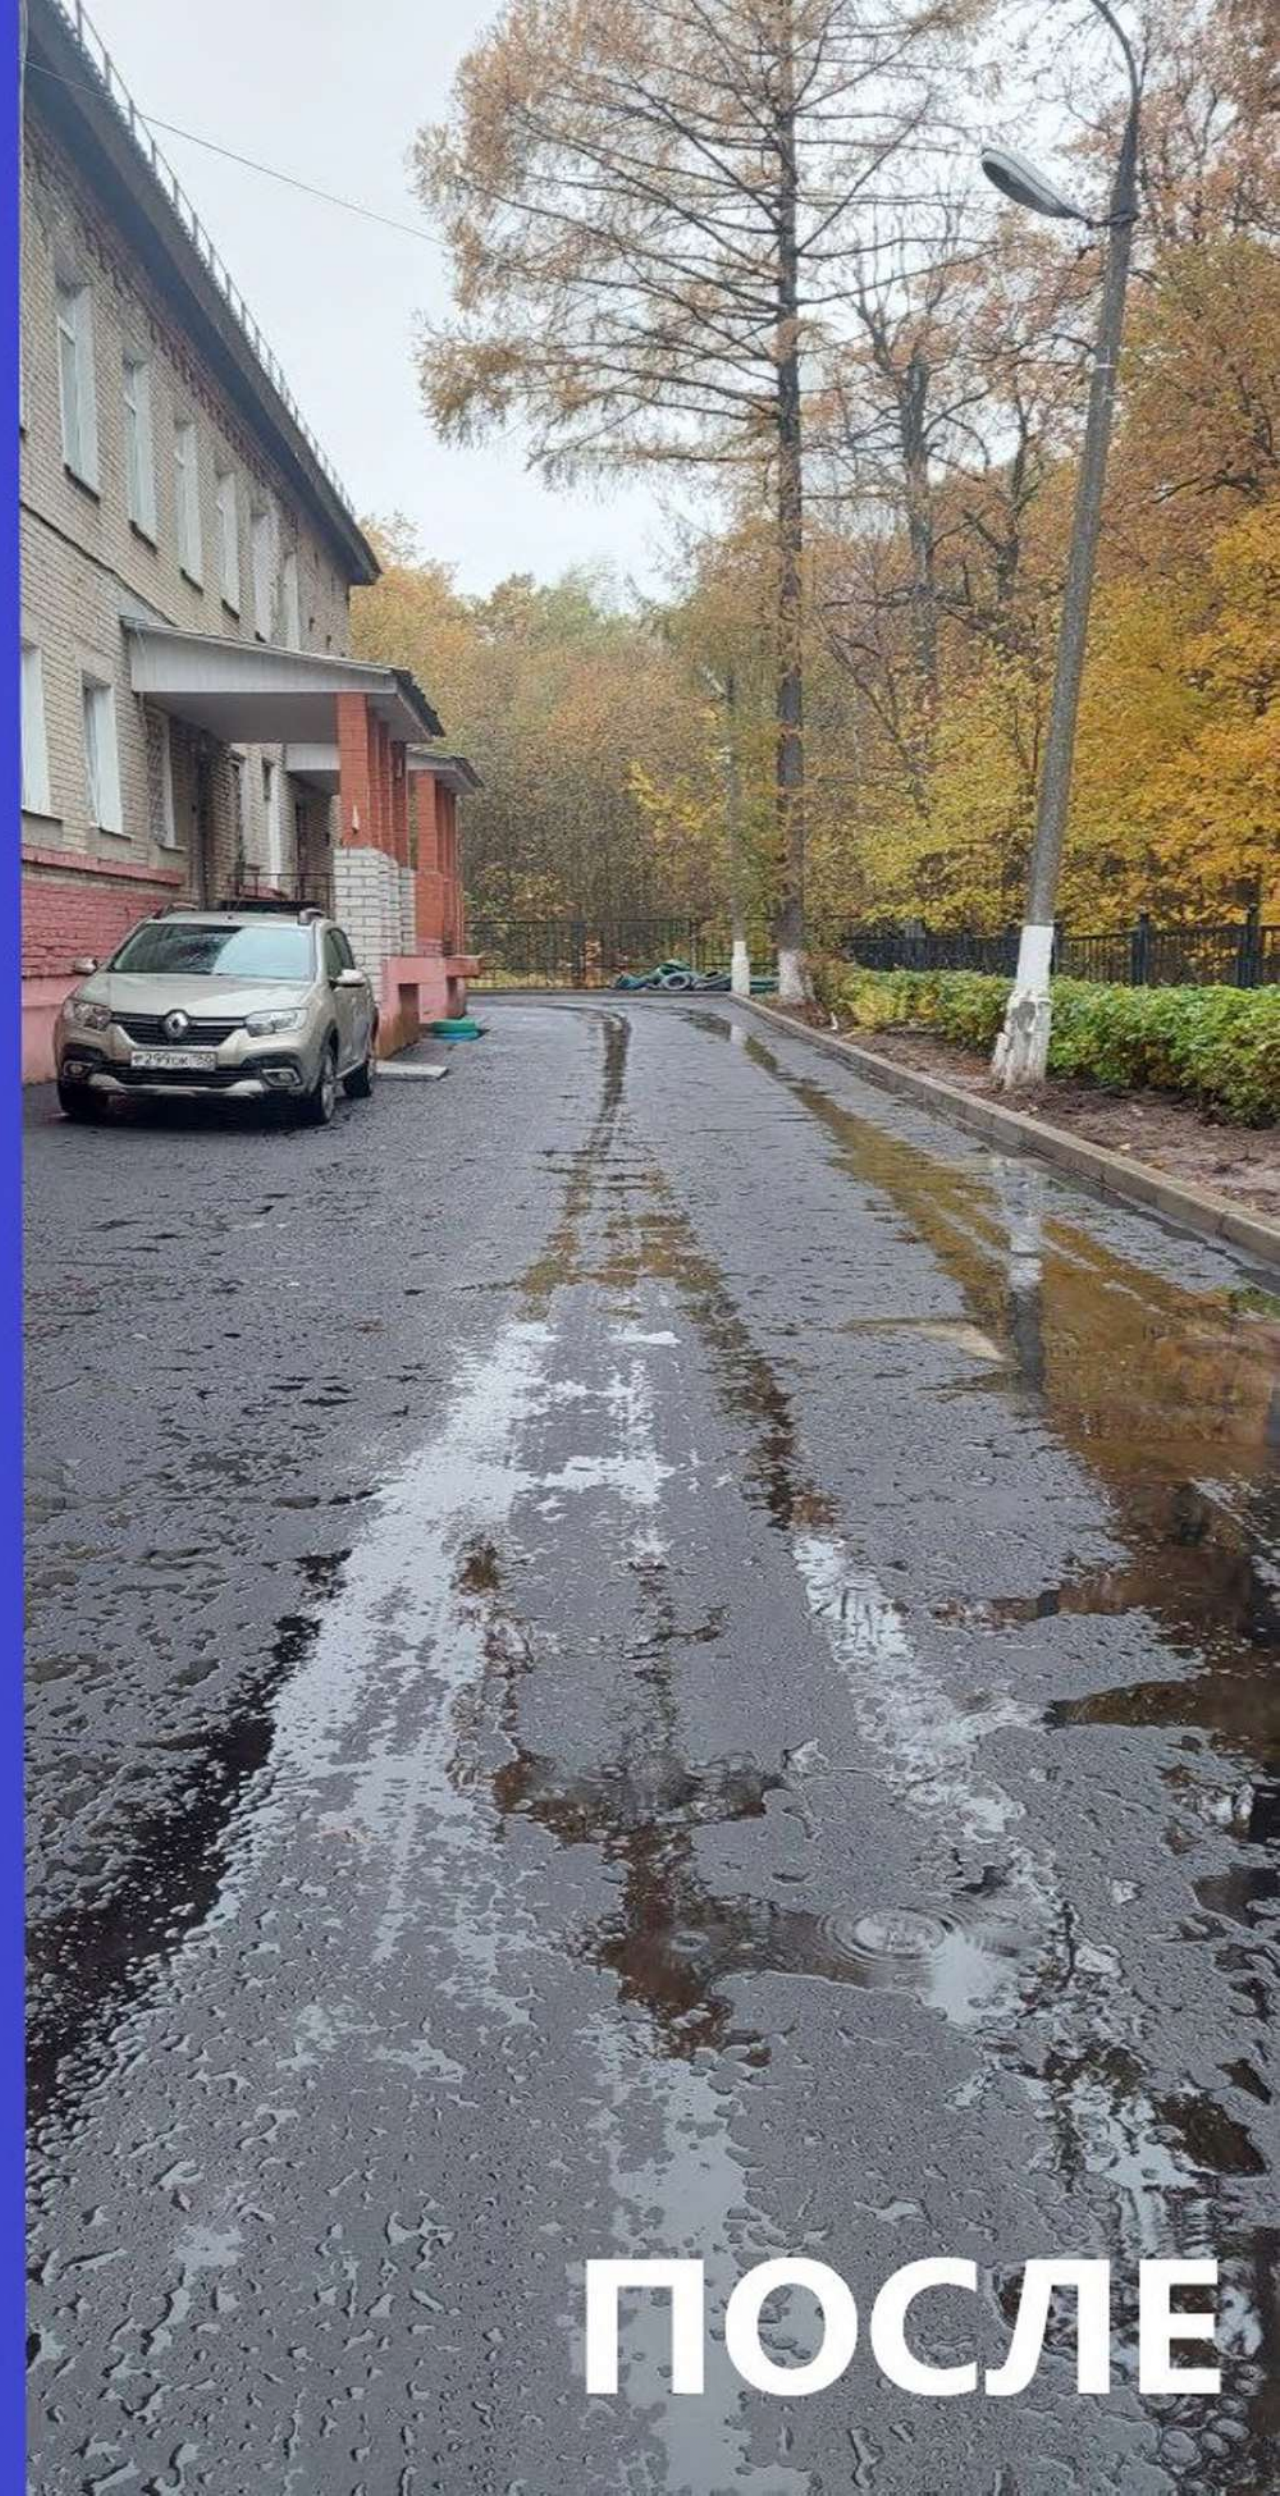

**ПОСЛЕ**
