

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Капитальный ремонт системы отопления, канализации и электросети здания

Муниципального бюджетного учреждения «Подорожково-молодёжный клуб «Новое поколение», расположенного по адресу:

Московская область, городской округ Воскресенск, рабочий посёлок Хорлово, проезд Парковый, д. 12

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.			
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего				
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9
3 000 000,00	2 850 000,00	120 000,00	30 000,00	2 905 975,46	2 760 676,69	116 239,02	29 059,75	2 905 975,46	2 760 676,69	116 239,02	29 059,75	0

* - Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ своевременно _____
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 22.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 10.12.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 11 листах: фотографии объекта до начала реализации проекта, этапов выполнения работ и по итогам реализации проекта.

Инициатор:

Аксаков Е.В.

(Ф.И.О.)


(Подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Бологников А.В.

(Ф.И.О.)


(Подпись)

Дата «15» декабря 2021 г.



Фотографи объекта до начала реализации проекта

Электроснабжение



Приложение






Отопление

Фотографии этапов выполнения работ

Электроснабжение

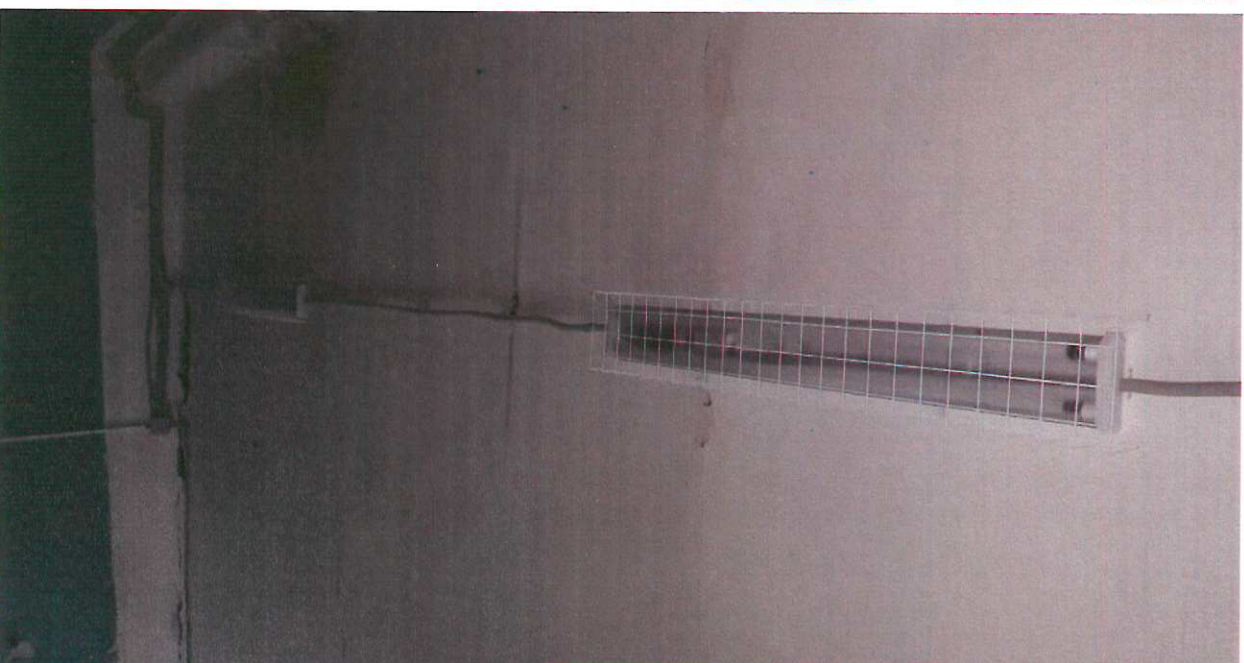



Фотографии по итогам реализации проекта

Электроснабжение





