

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
подрядчик нарушил сроки выполнения работ

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 23.08.2021 г.;


4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 01.11.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 6 листах: фотографии пруда до начала работ, промежуточные этапы выполнения, по итогам реализации проекта.

Инициатор:

Слепов С.С.

(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Болотников А.В.

(Ф.И.О.)


(подпись)




Дата: «10» ноября 2021 г.

Пруд до начала работ




Приложение

Выполнение работ по благоустройству пруда

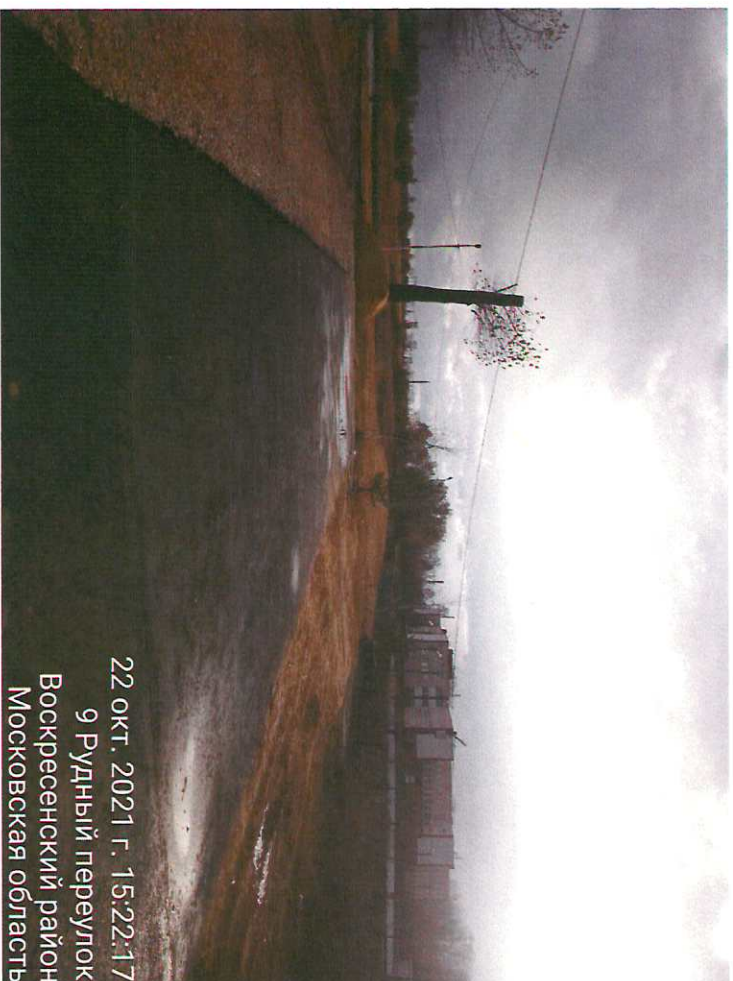

22 окт. 2021 г. 15:22:17
9 Рудный переулок
Воскресенский район
Московская область

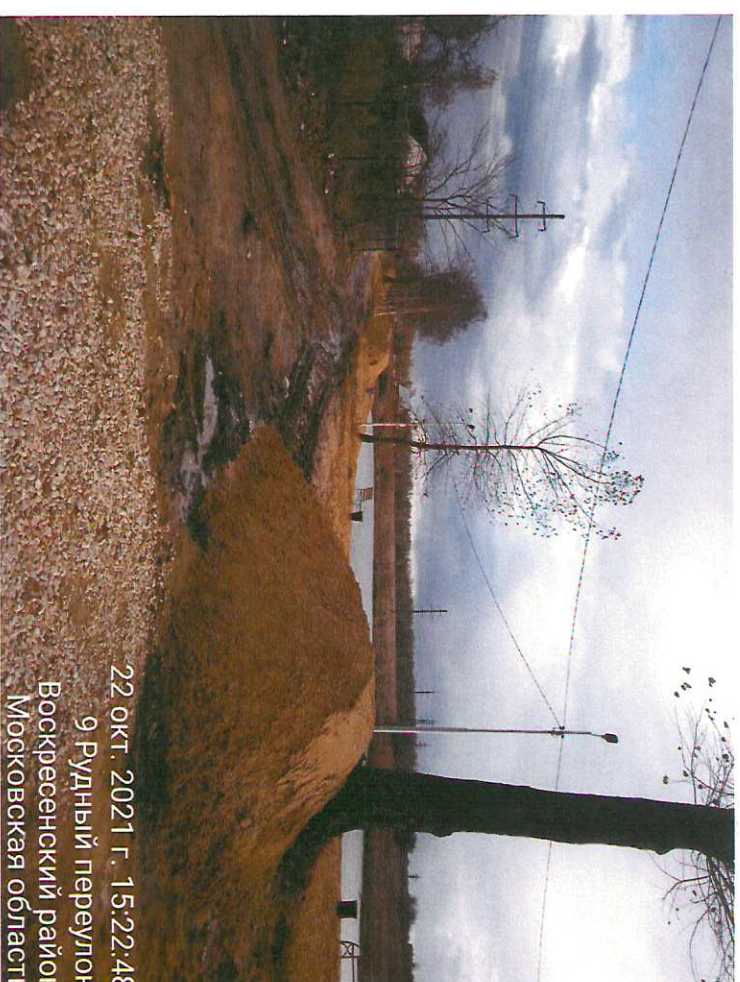


22 окт. 2021 г. 15:22:48
9 Рудный переулок
Воскресенский район
Московская область


Друд после окончания работ по благоустройству



26 окт. 2021 г. 12:42:19
19 Рудничный переулок
Воскресенский район
Московская область

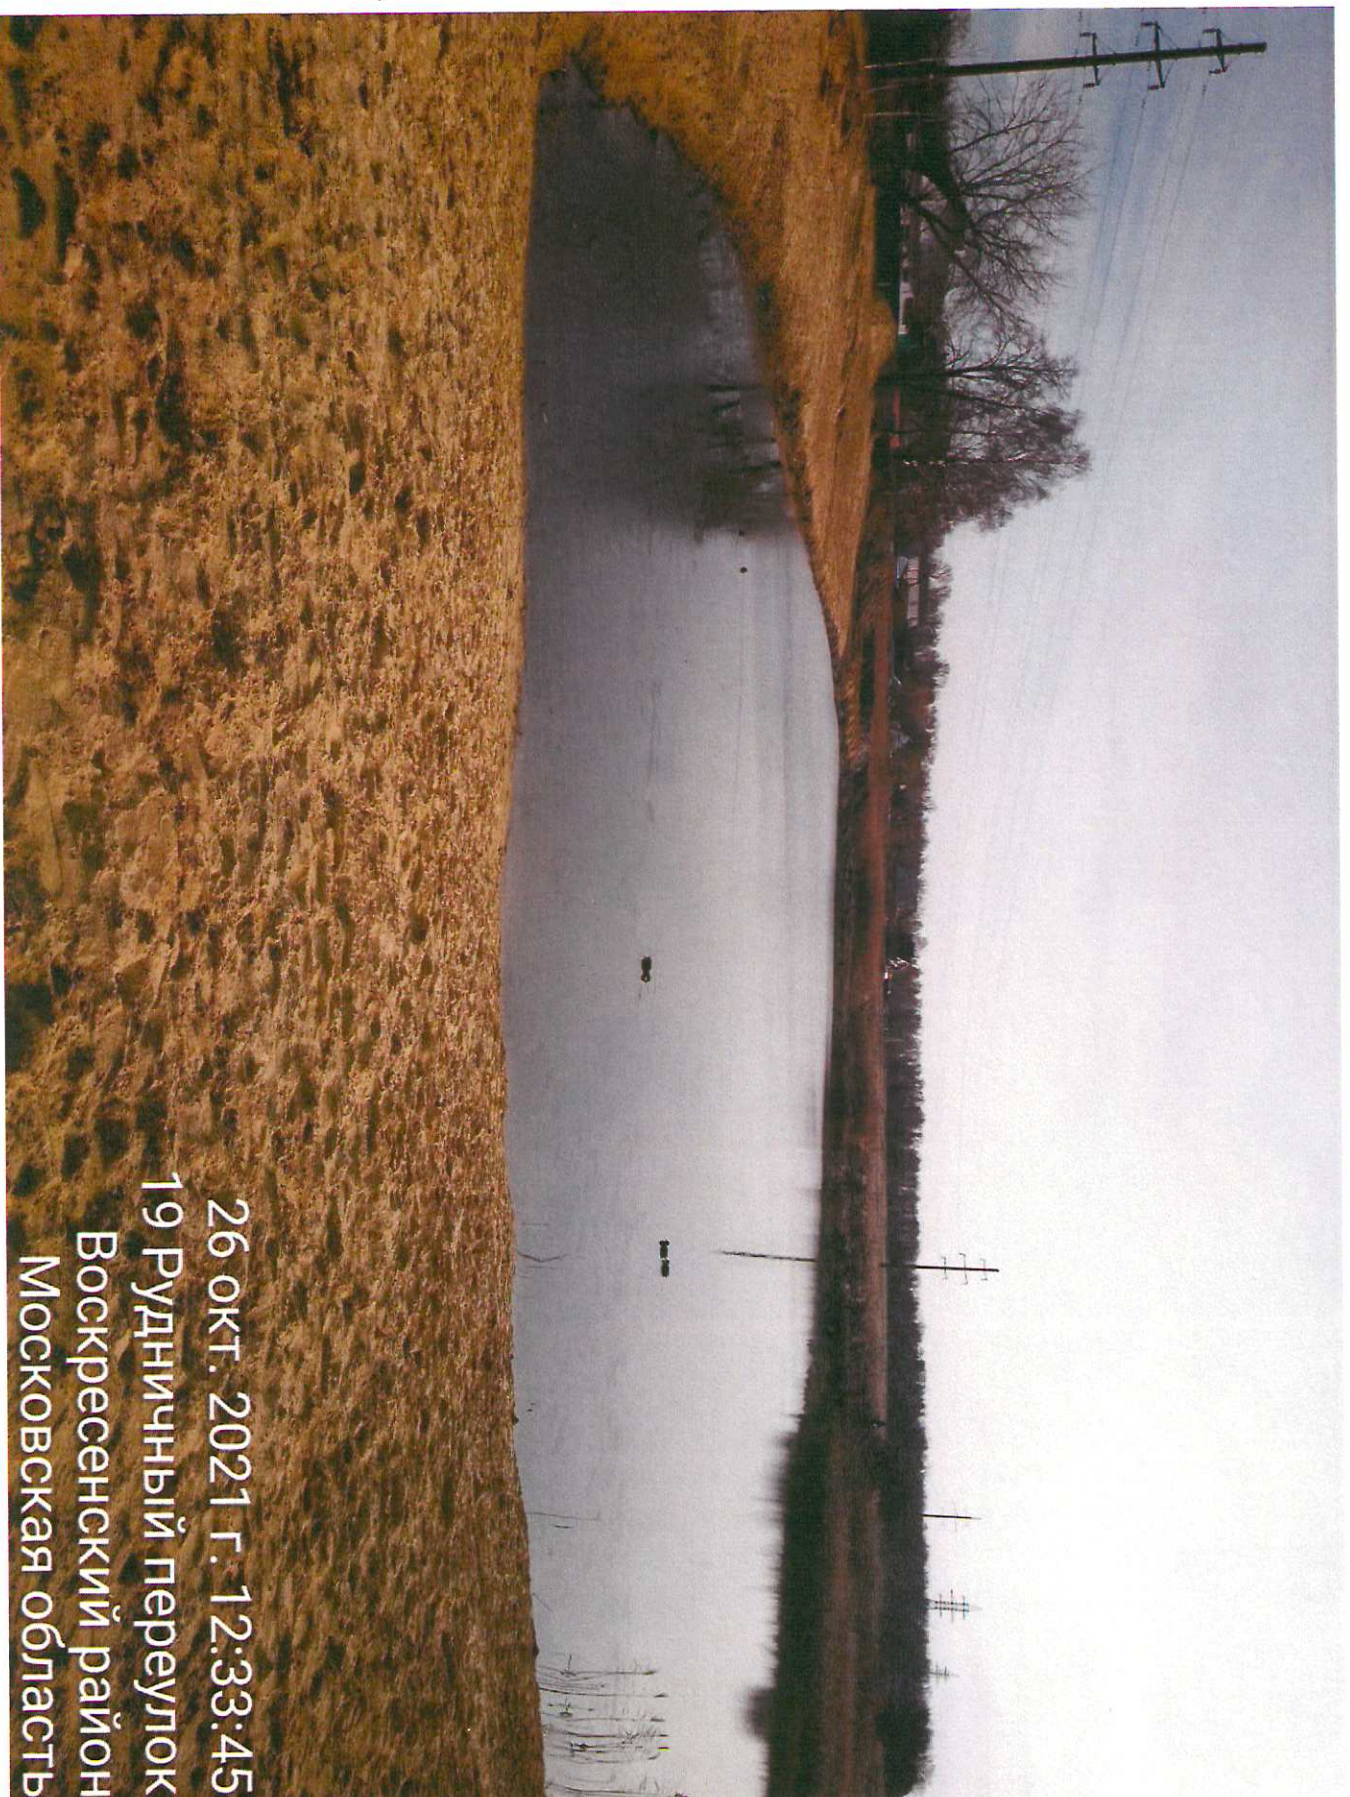

26 окт. 2021 г. 12:33:45
19 Рудничный переулок
Воскресенский район
Московская область

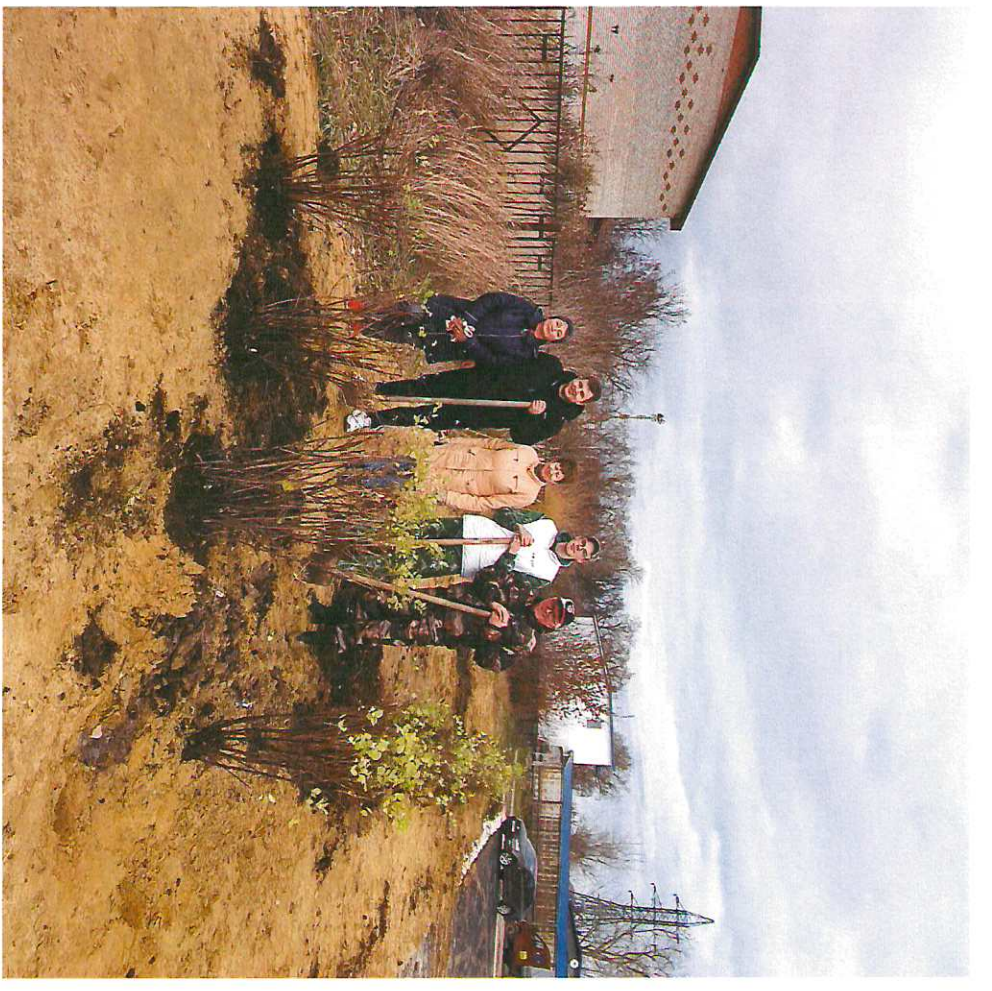

БЫЛО

пруд на Фетровой

#СделаемВместе

СТАЛО

