

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Устройство спортивной площадки "Воркаут" по адресу: Московская область,

городской округ Воскресенск, д.Золотово, ул.Московская

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	П
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения г*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения г*	Всего		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	13=5-9	
375 000,00	356 000,00	15 250,00	3 750,00	309 660,00	293 344,00	12 566,00	3 750,00	309 000,00	660,00	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

**2. Сведения об итогах реализации проекта.**

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно  
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: \_\_\_\_\_
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 24.10.2022 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 28.11.2022 г.
5. К отчету прилагаются на 2 листах фотографии объекта по итогам реализации проекта.

Инициатор:

Коркин М.А.  
(Ф.И.О.) \_\_\_\_\_  
(подпись)

Глава городского округа Воскресенск



Болотников А.В.  
(Ф.И.О.) \_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.



Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

Фотографии объекта по итогам реализации проекта

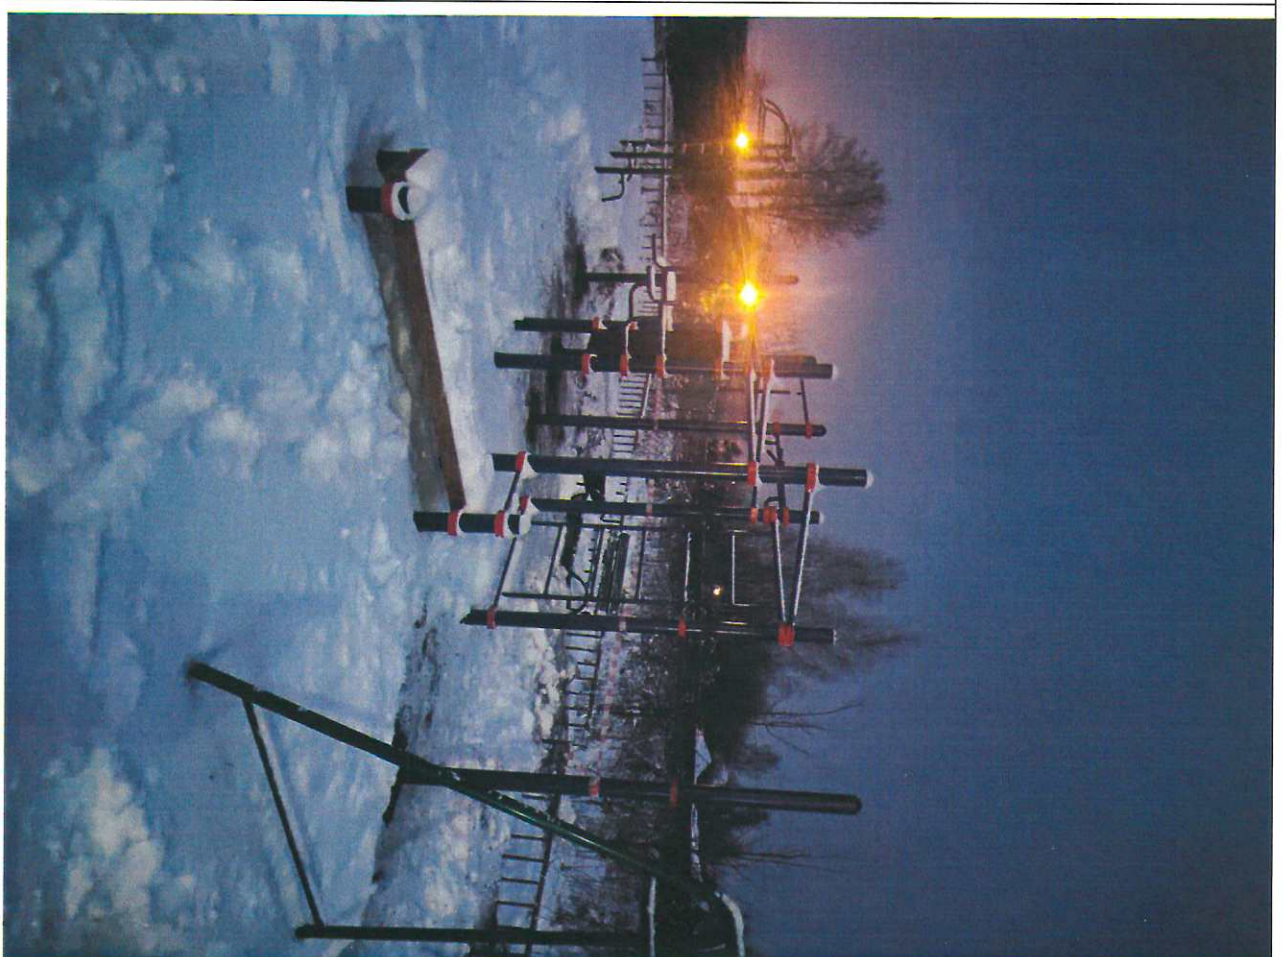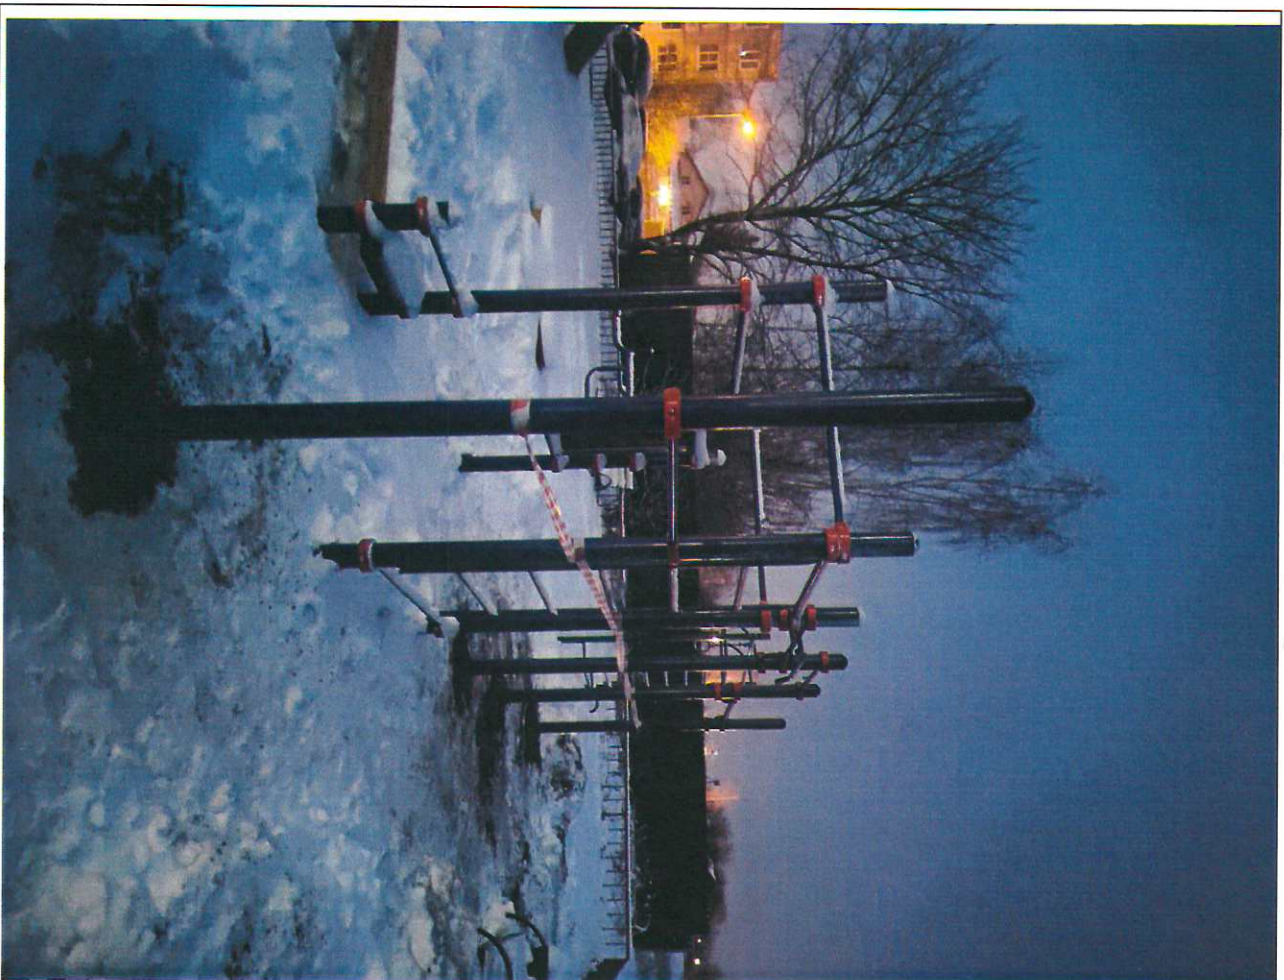

Приложение

