

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Выполнение работ по текущему ремонту цоколя и отместки здания муниципальной

бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Химик»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неисполненных работ, руб.	Примечание			
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения ия*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения ия*	Всего					
	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
250 000,00	237 000,00	10 500,00	2 500,00	219 000,00	208 050,00	8 450,00	2 500,00	219 000,00	208 050,00	8 450,00	2 500,00	0,00	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 23.09.2021г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 07.10.2021г.

5. К отчету прилагаются на 7 листах: фотографии объекта до начала работ и по итогам реализации проекта.

Инициатор:

Васильев Н.И.

(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Болотников А.В.

(Ф.И.О.)

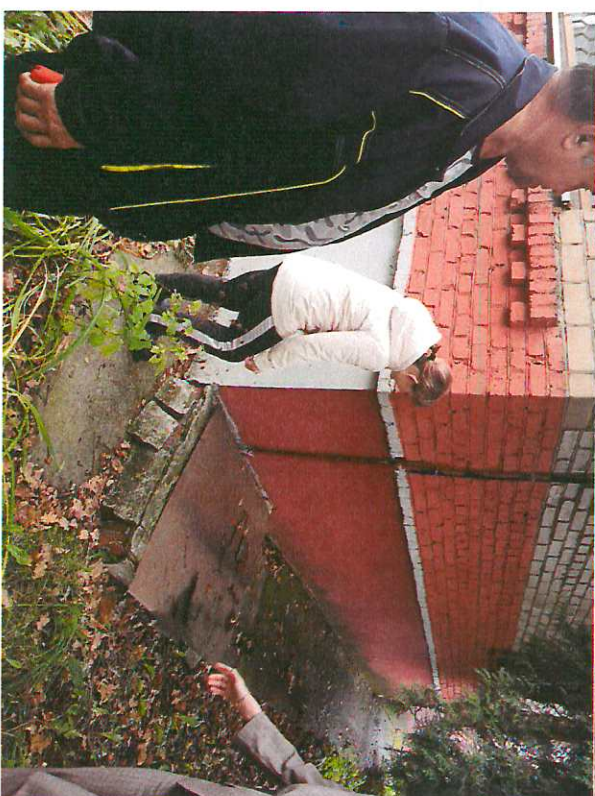

(подпись)



Дата «11» октября 2021 г.

До проведения ремонта цоколя и отмостки здания МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Химик»

Приложение





Выполнение работ по текущему ремонту покрытия и отмостки здания МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Химик»







После окончания текущего ремонта цоколя и отмостки здания МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Химик»



