

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Устройство системы видеонаблюдения на корпусе № 2 в МОУ "СОШ № 17" по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Чапаева, здание 1 г.

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
208 000,0	119 000,0	86 920,0	2 080,0	181 682,69	92 682,69	86 920,0	2 080,0	162 000,0	92 682,69	67 697,31	1 620,0	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

### 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно  
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:  
\_\_\_\_\_

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 04.10.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 12.10.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 16 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы:

Бутенко В.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Малкин А.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата « 20\_\_ г.



























SAMSUNG


TANTOS

VIDEO RECORDER  
ВІДЕОРЕКОРДАТОР

Important:  
This equipment  
must be installed  
correctly.

TANTOS



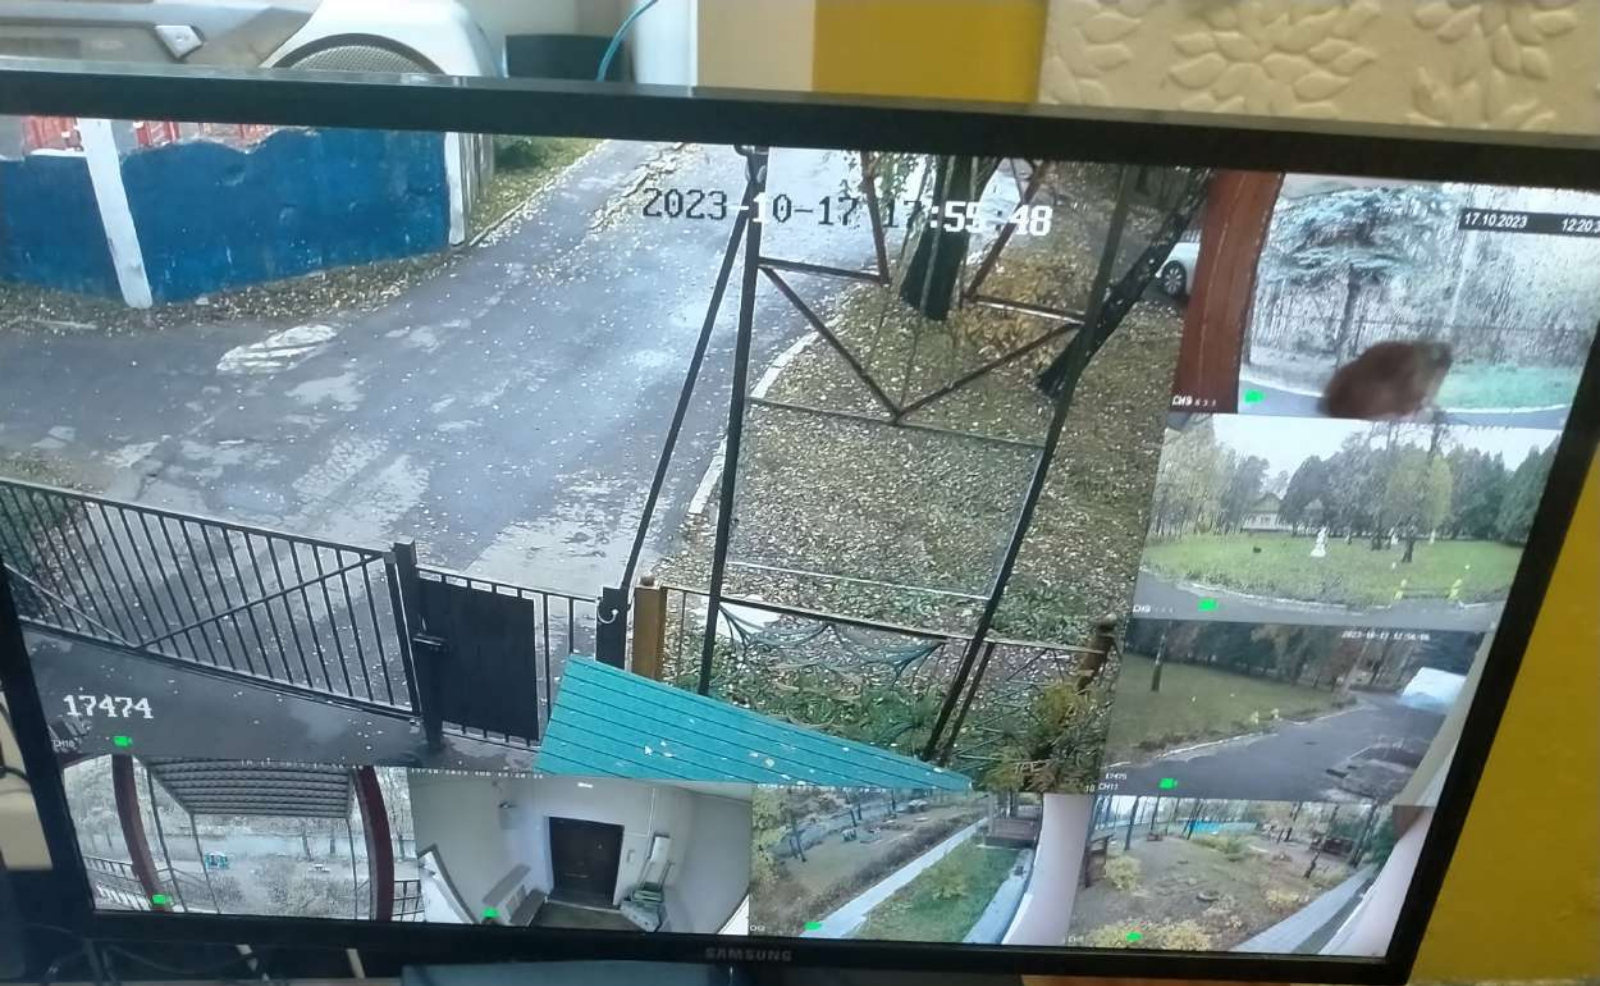



10/17/2023 12:56:17PM B

 TANTOS

 TANTOS

02[D]Кам 2

 TANTOS

01[D]Кам 1

 TANTOS

03[D]Кам 3

 TANTOS

04[D]Кам 4

05[D]Кам 5

06[D]Кам 6

TANTOS

Документы на рабочем столе:

- Сервисная записка от 17 октября 2023 г.
- ПРИКАЗЫВАЮ: (с подписью и печатью)
- 2023 (календарь)

