

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Выполнение работ по устройству стационарной крытой уличной сцены для структурного подразделения «Дом культуры д. Чемодурово» муниципального учреждения «Воскресенский координационно-методический центр культуры и творчества «Истоки»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Исполнено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего	
	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	13=5-9
1 000 000,00	950 000,00	40 000,00	10 000,00	951 263,26	903 700,10	38 050,53	9 512,63	951 263,26	-

* - Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен с нарушением сроков
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: работе приступили к выполнению работ позже назначенного срока
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 22.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 20.12.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 4 листах: *(фотографии промежуточных этапов выполнения работ и объекта по итогам реализации проекта).*

Инициатор:

Мазуров А.Б.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Бологтников А.В.

(Ф.И.О.)



(подпись)

М.П.

Дата «24» декабря 2021 г.



Фотографии промежуточных этапов выполнения работ

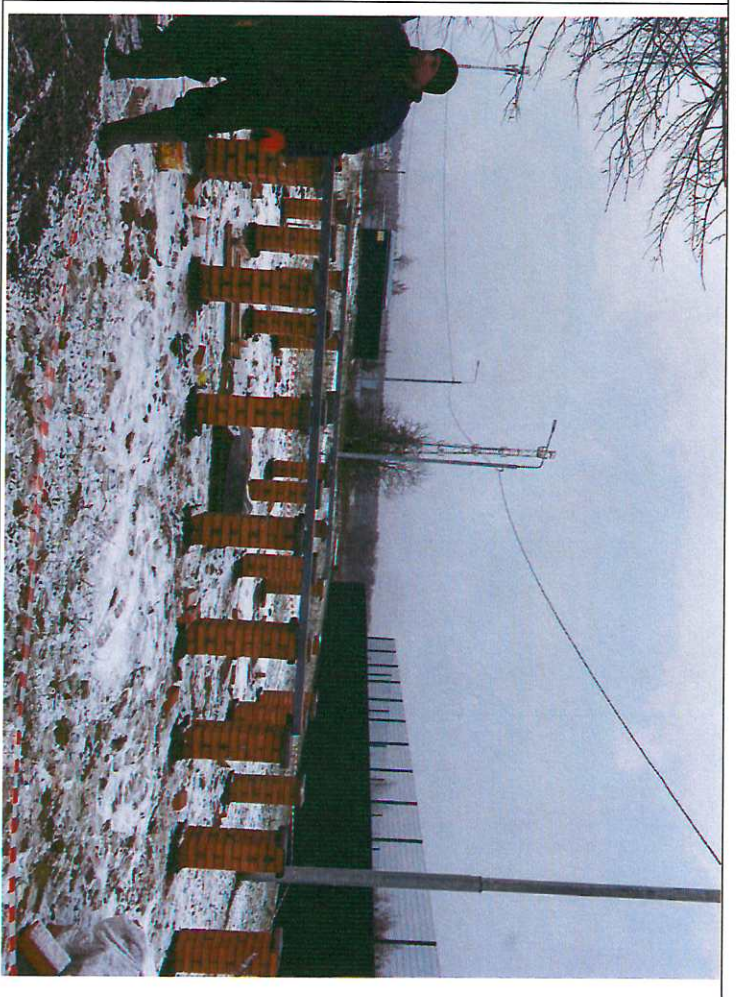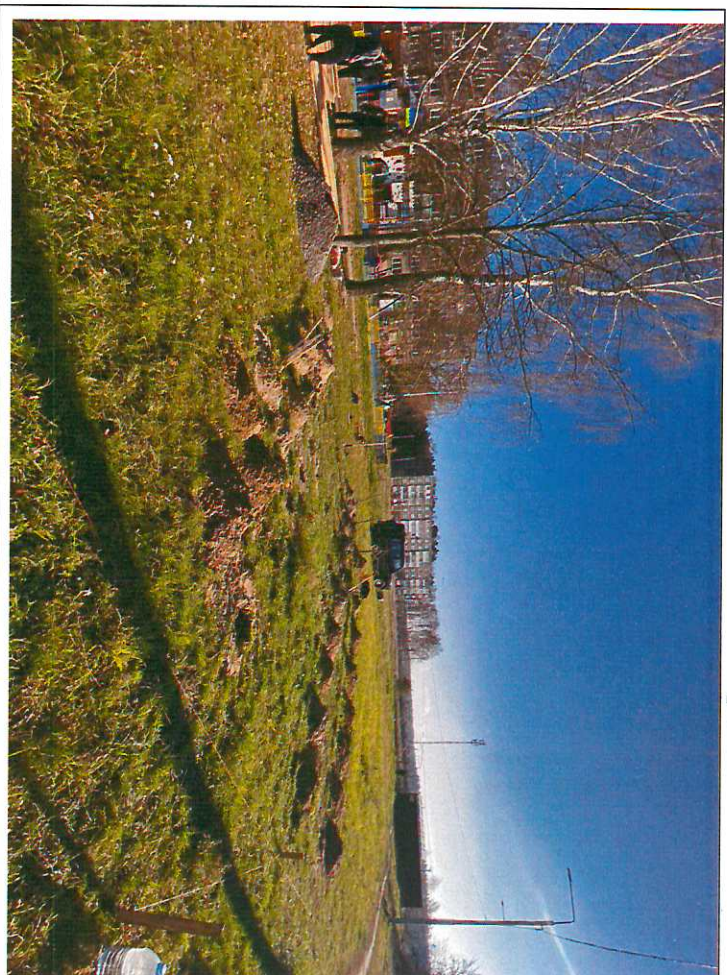

Приложение

